



Kanton Basel-Stadt

Begleitgruppe Clarastrasse

Treffen vom 23. Januar 2023



Kanton Basel-Stadt

Überarbeitetes Bauprogramm

Annarita Vintan-Koger, Gesamtprojektleiterin Tiefbauamt Basel-Stadt

Neu: Unterbruch der Bauarbeiten für

- Fasnacht
- ArtBasel
- Weihnachtsgeschäft (Dezember bis Mitte Januar)


jeweils mit Absicherung der Baugruben

Dafür notwendig: Zeitfenster mit Zwei-Schichtbetrieb von 6 bis 22 Uhr und einzelne Samstagsarbeiten.


Ziel der Etappierung:

Trottoirs, Zugänge, Geschäfte,
Restaurants nur möglichst kurz
beinträchtigen.


Leitungsbau: 17. April bis August 2023

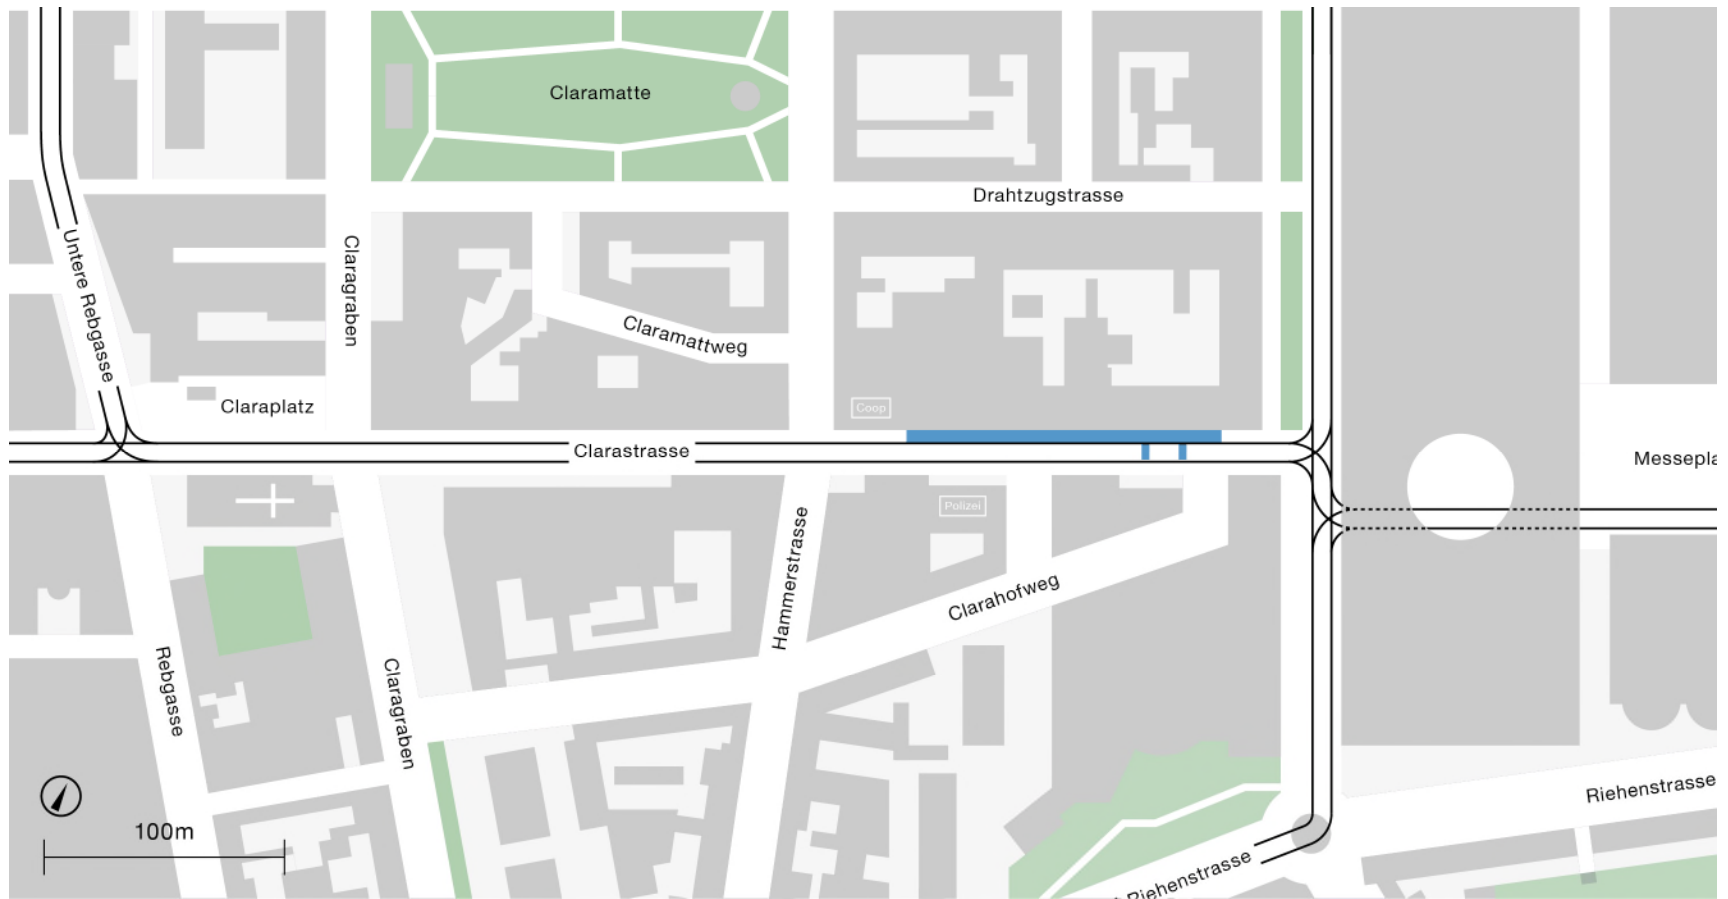


Beispiel Leitungsbau: Clarastrasse 29 bis 57

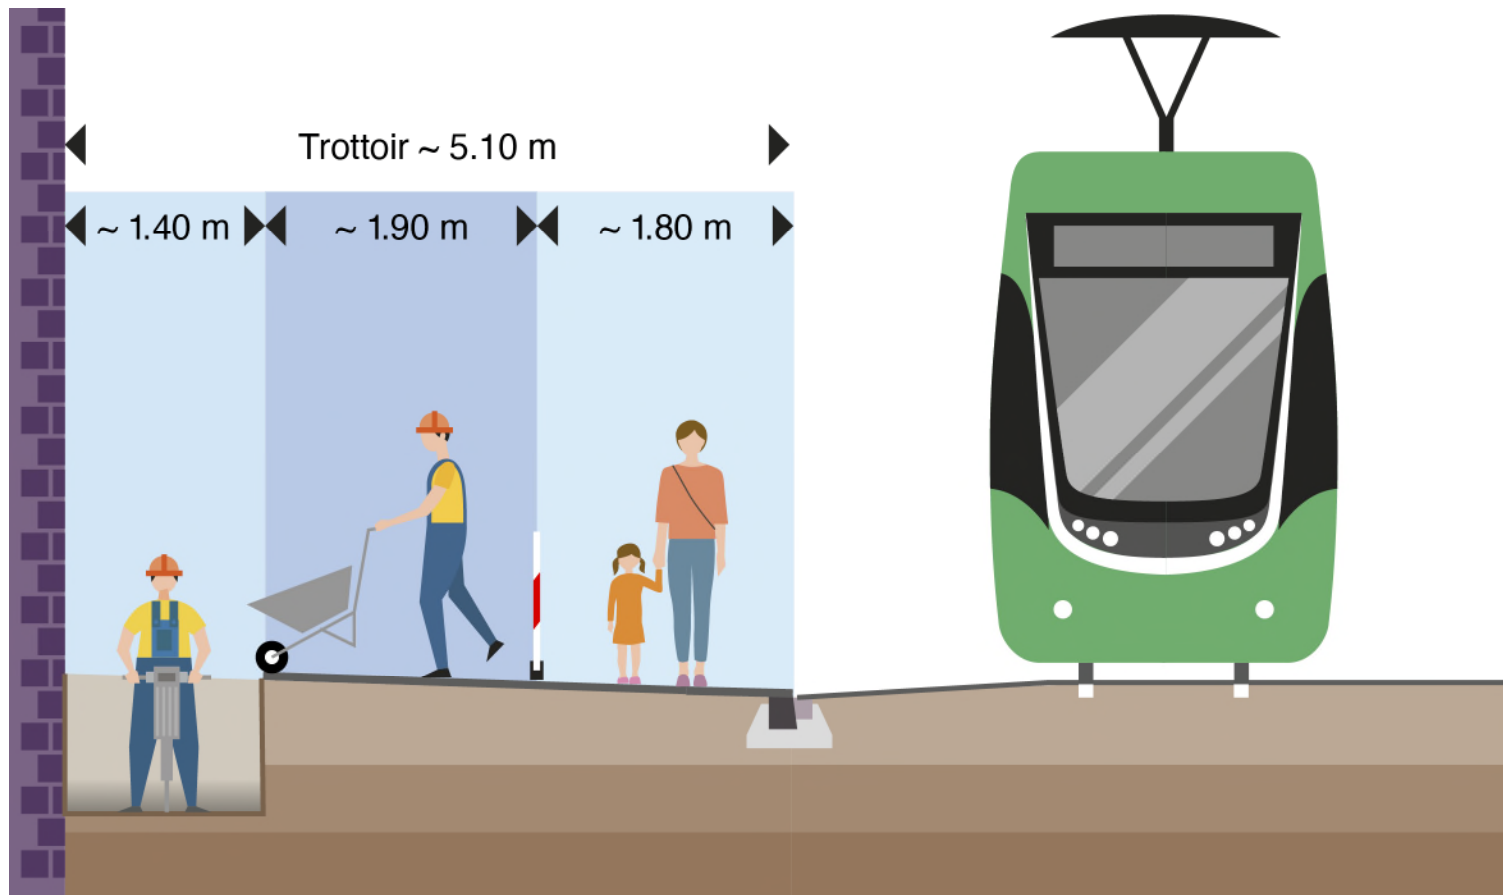


Beispiel Leitungsbau: Clarastrasse 29 bis 57

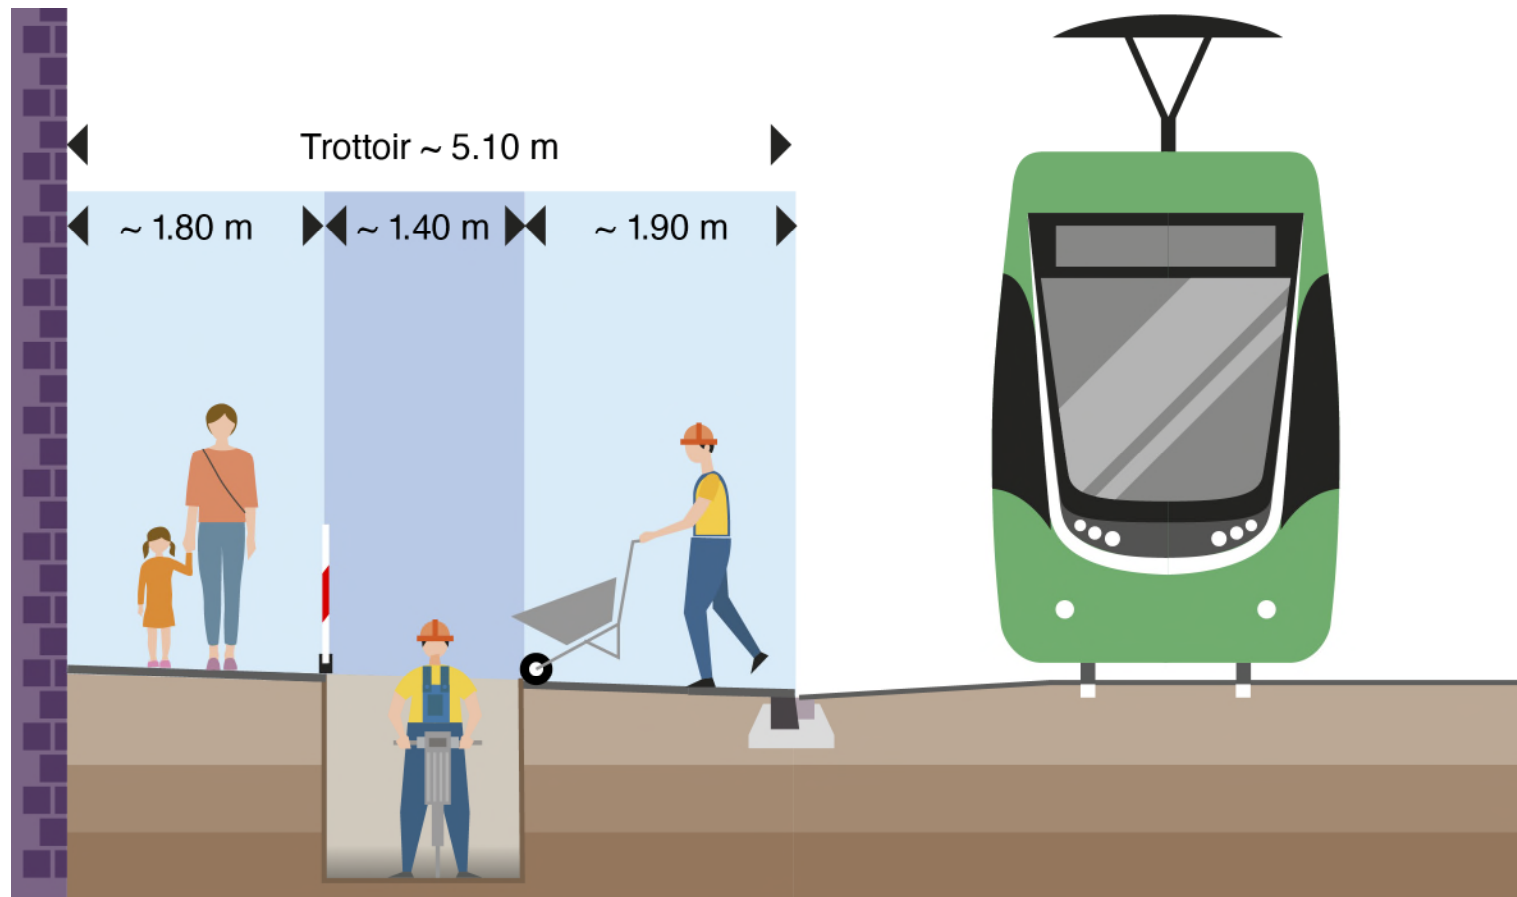


Leitungsbau: Mai / August bis November 2023

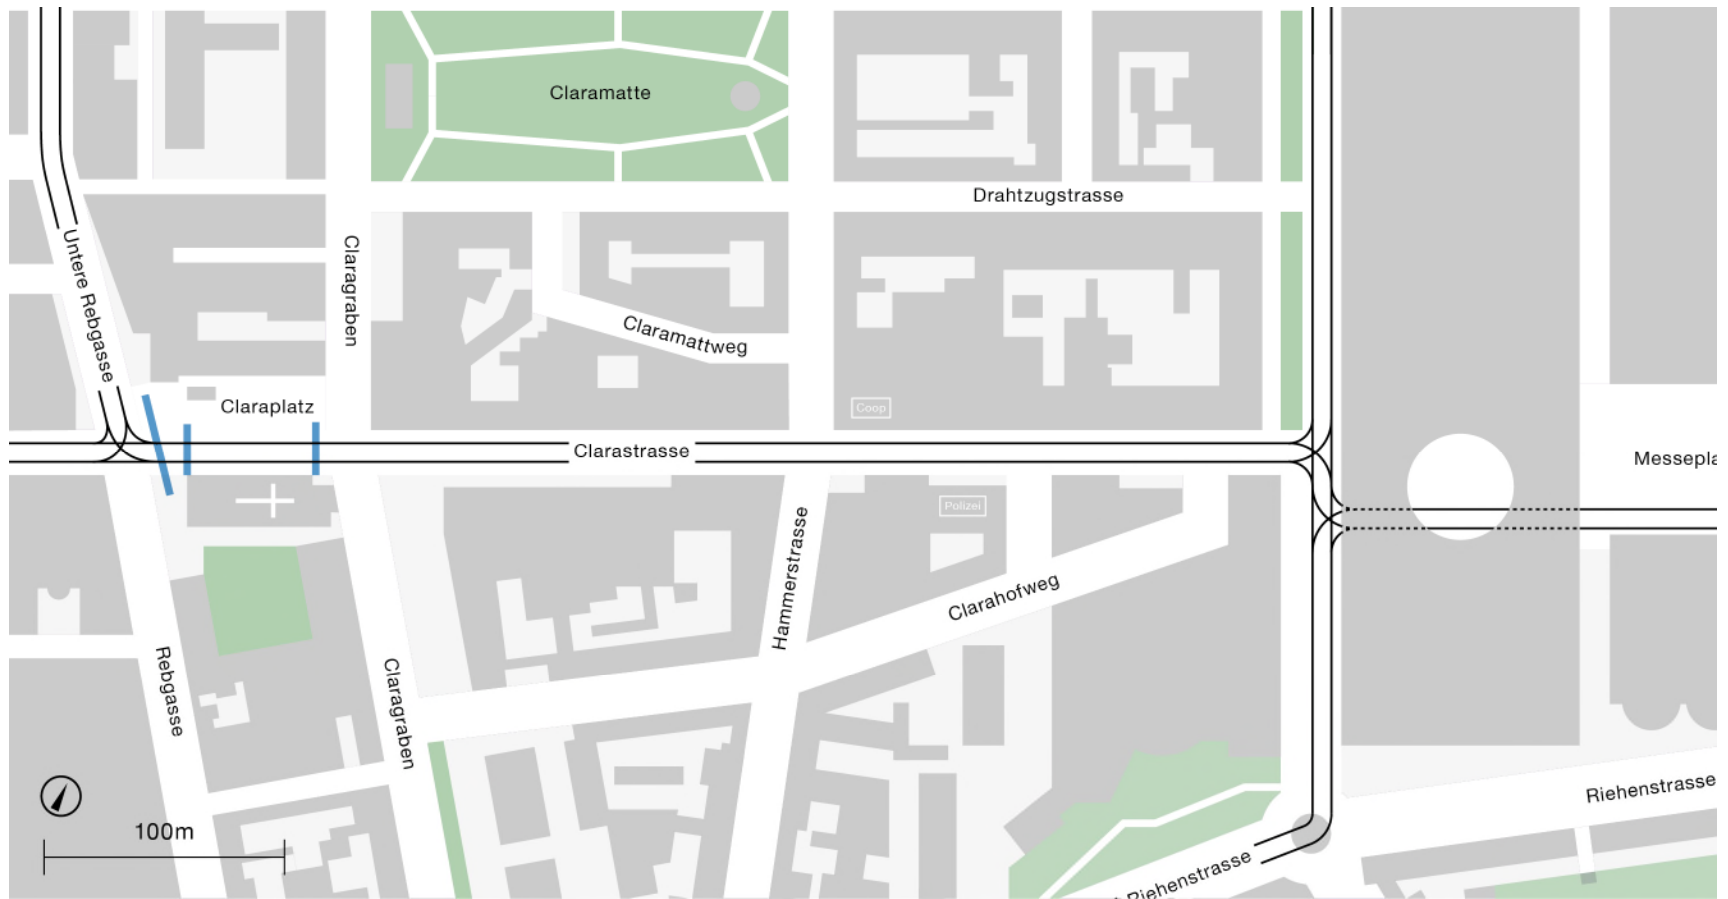


Leitungsbau: Juli bis Oktober 2023

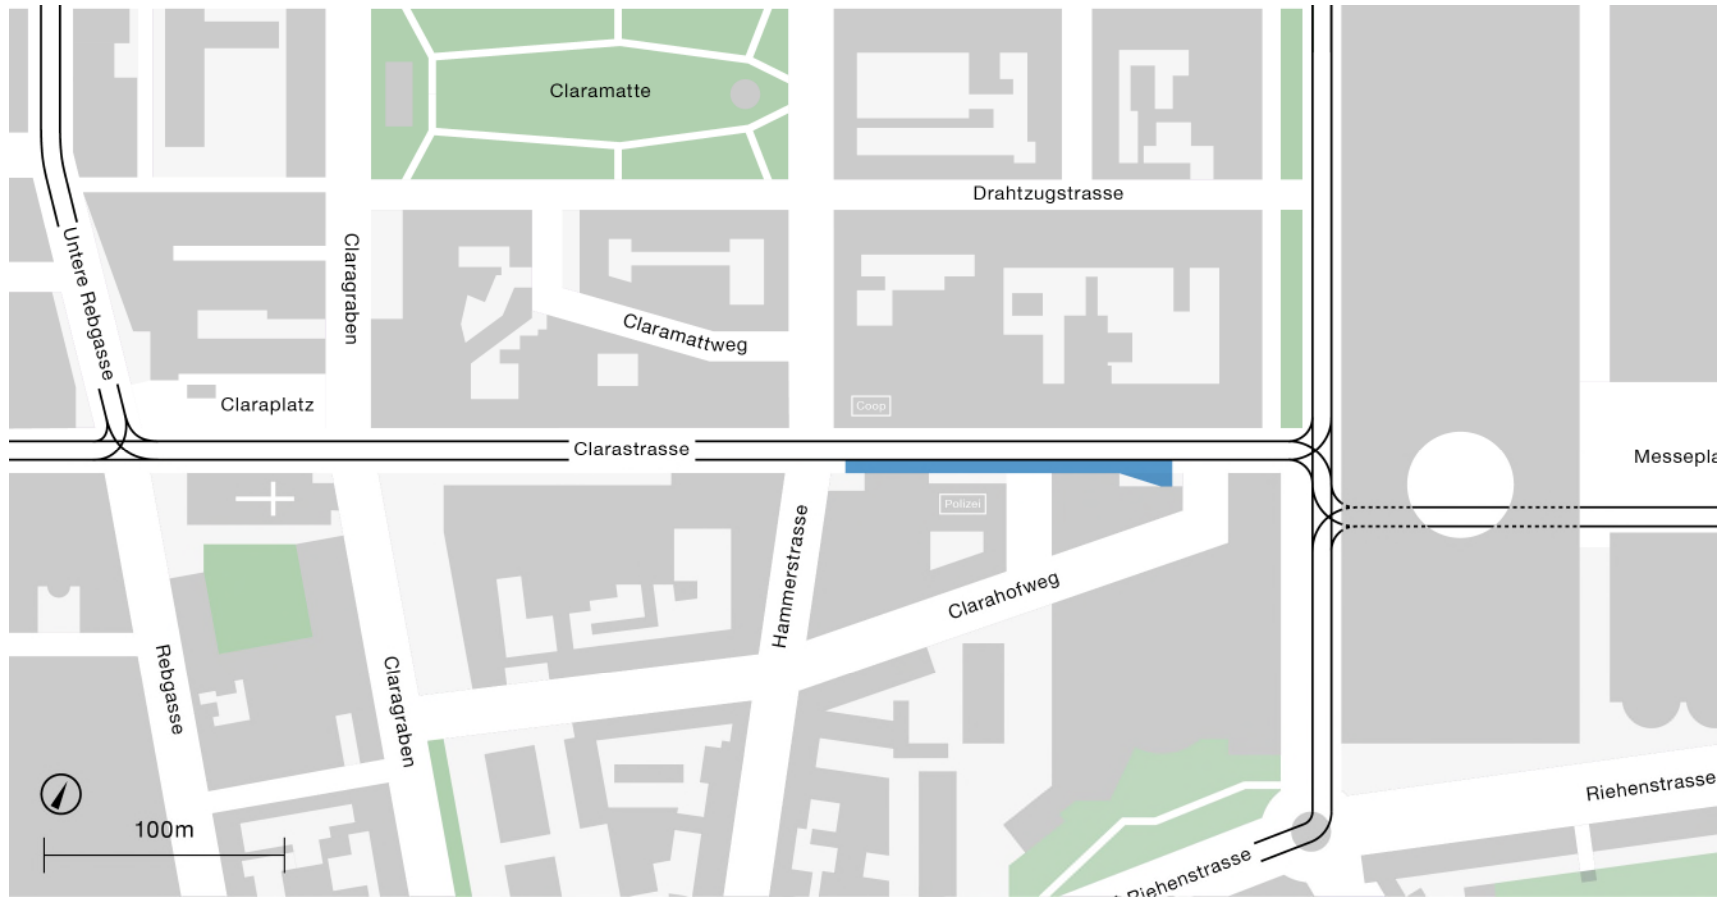


Leitungsbau: Mitte Juli bis November 2023

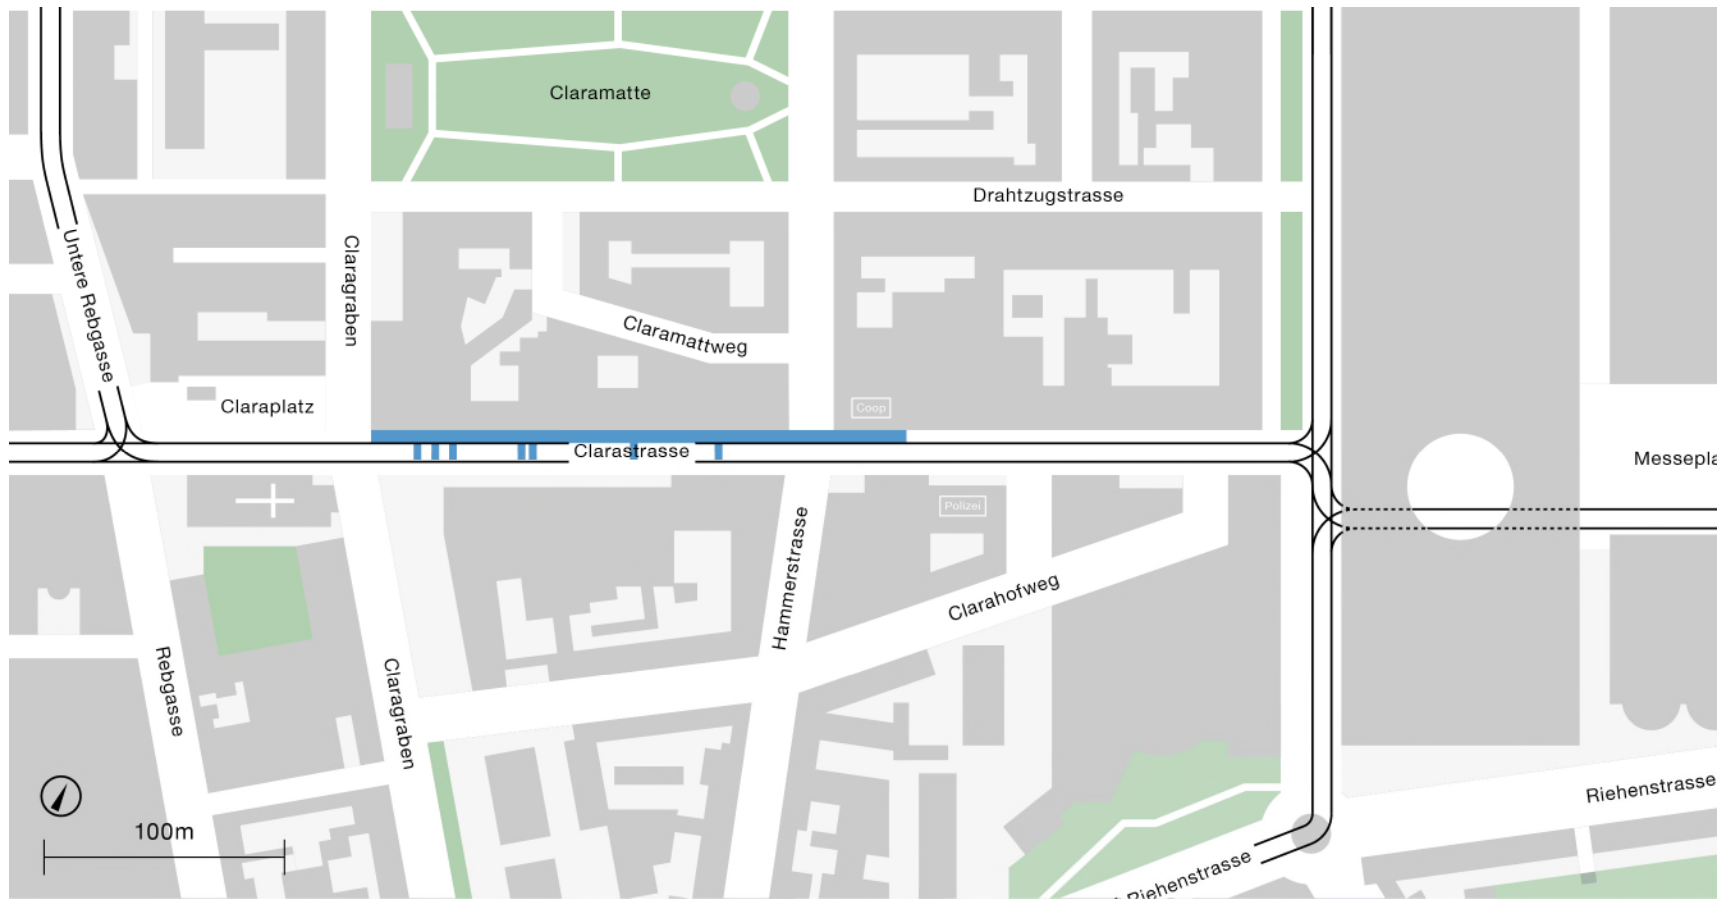


Beispiel Leitungsbau Etappe 1b: Clarastrasse 21 bis 29

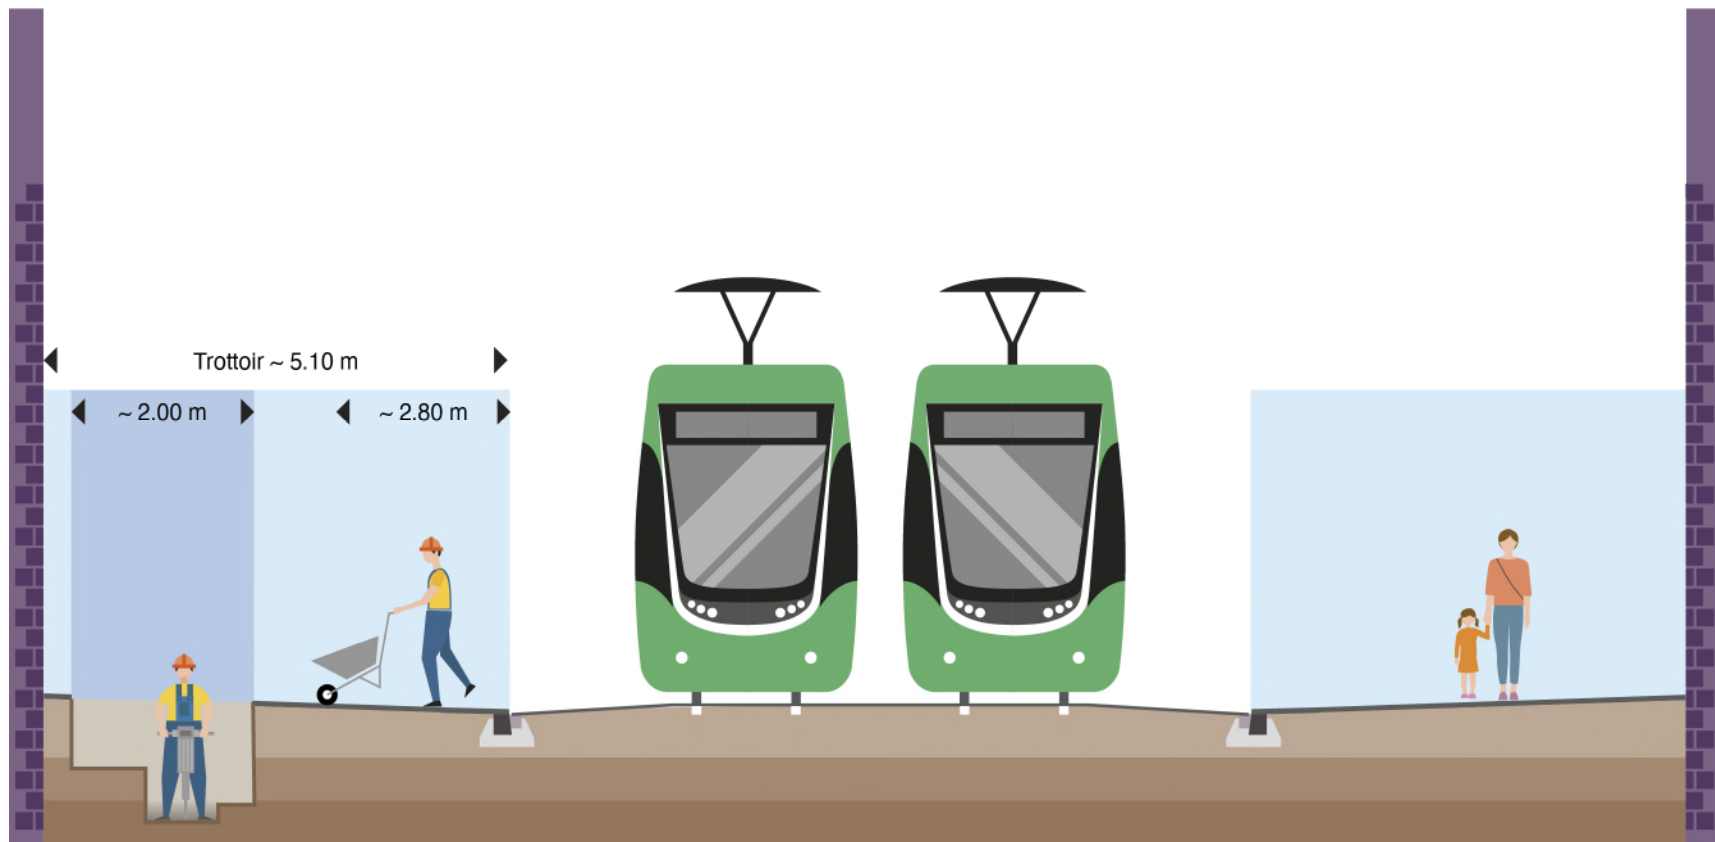

Beispiel Leitungsbau Etappe 1b: Clarastrasse 1 bis 21

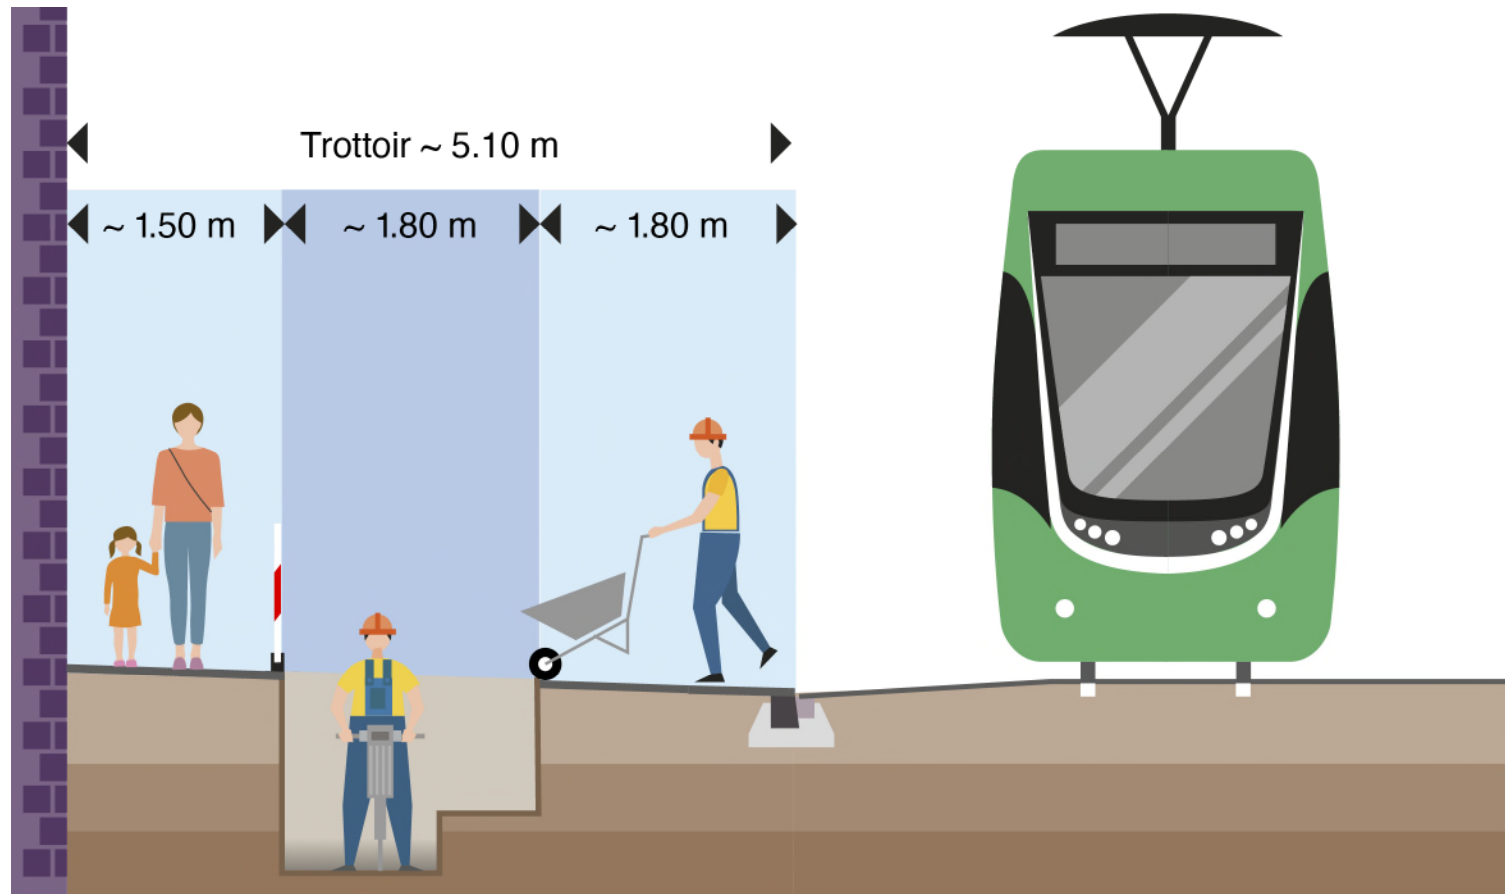


Leitungsbau: Februar bis August 2024

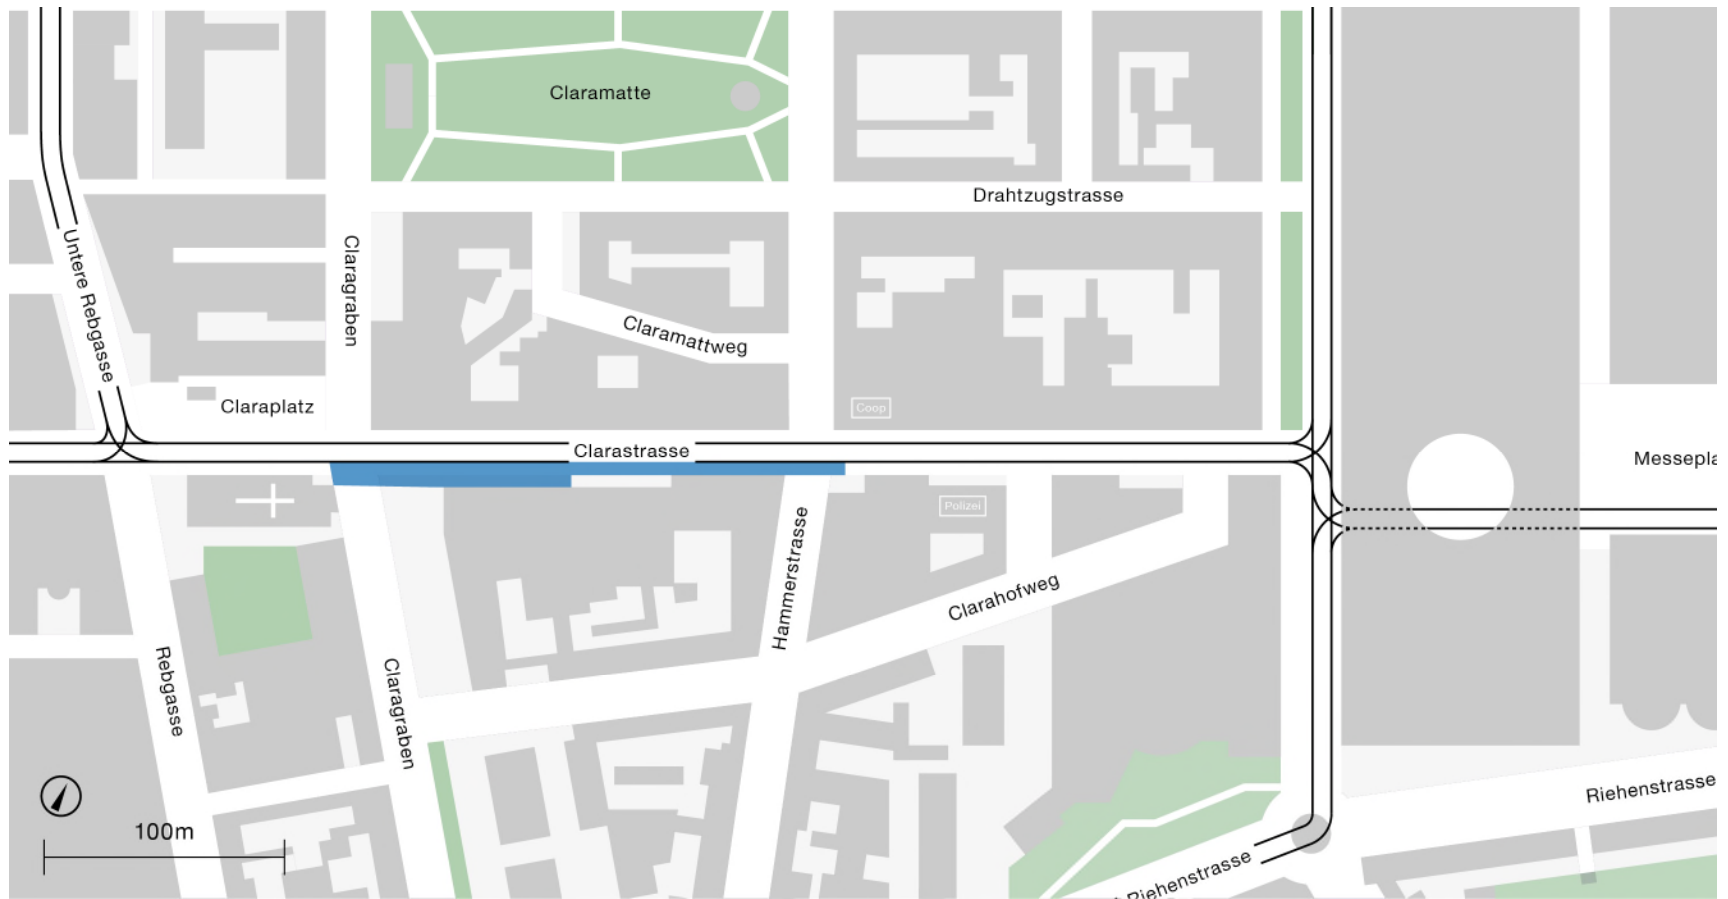


Leitungsbau: April bis August 2024




Gleisbau: September bis November 2024

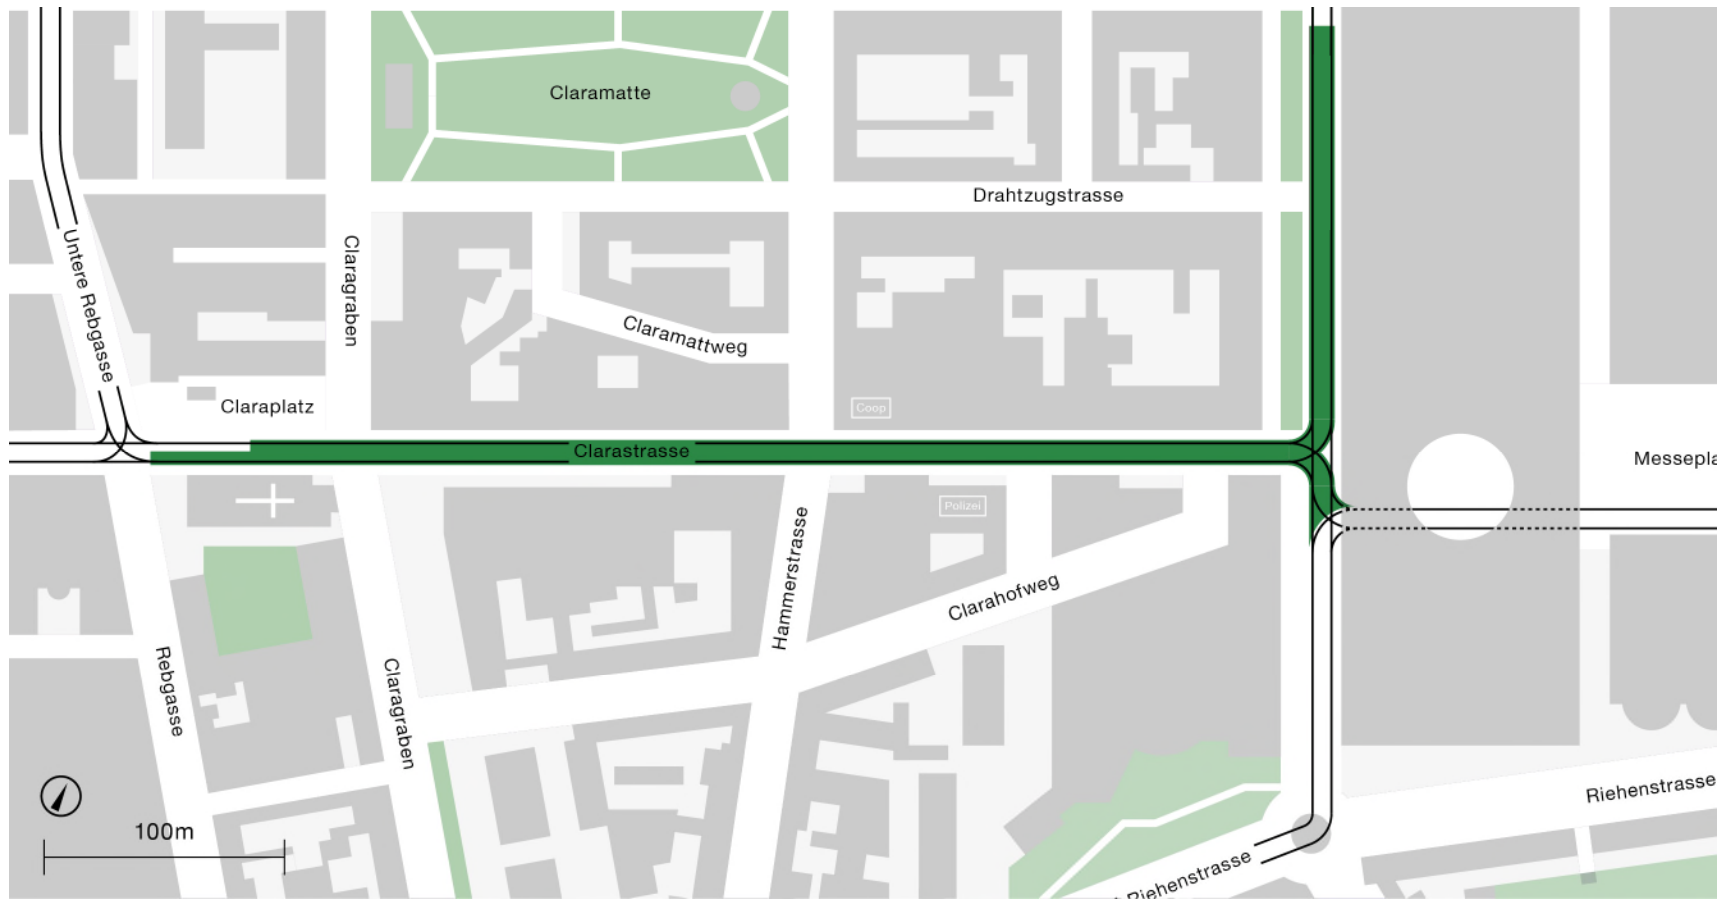


Pflasterung Haltestelle: Oktober bis November 2024

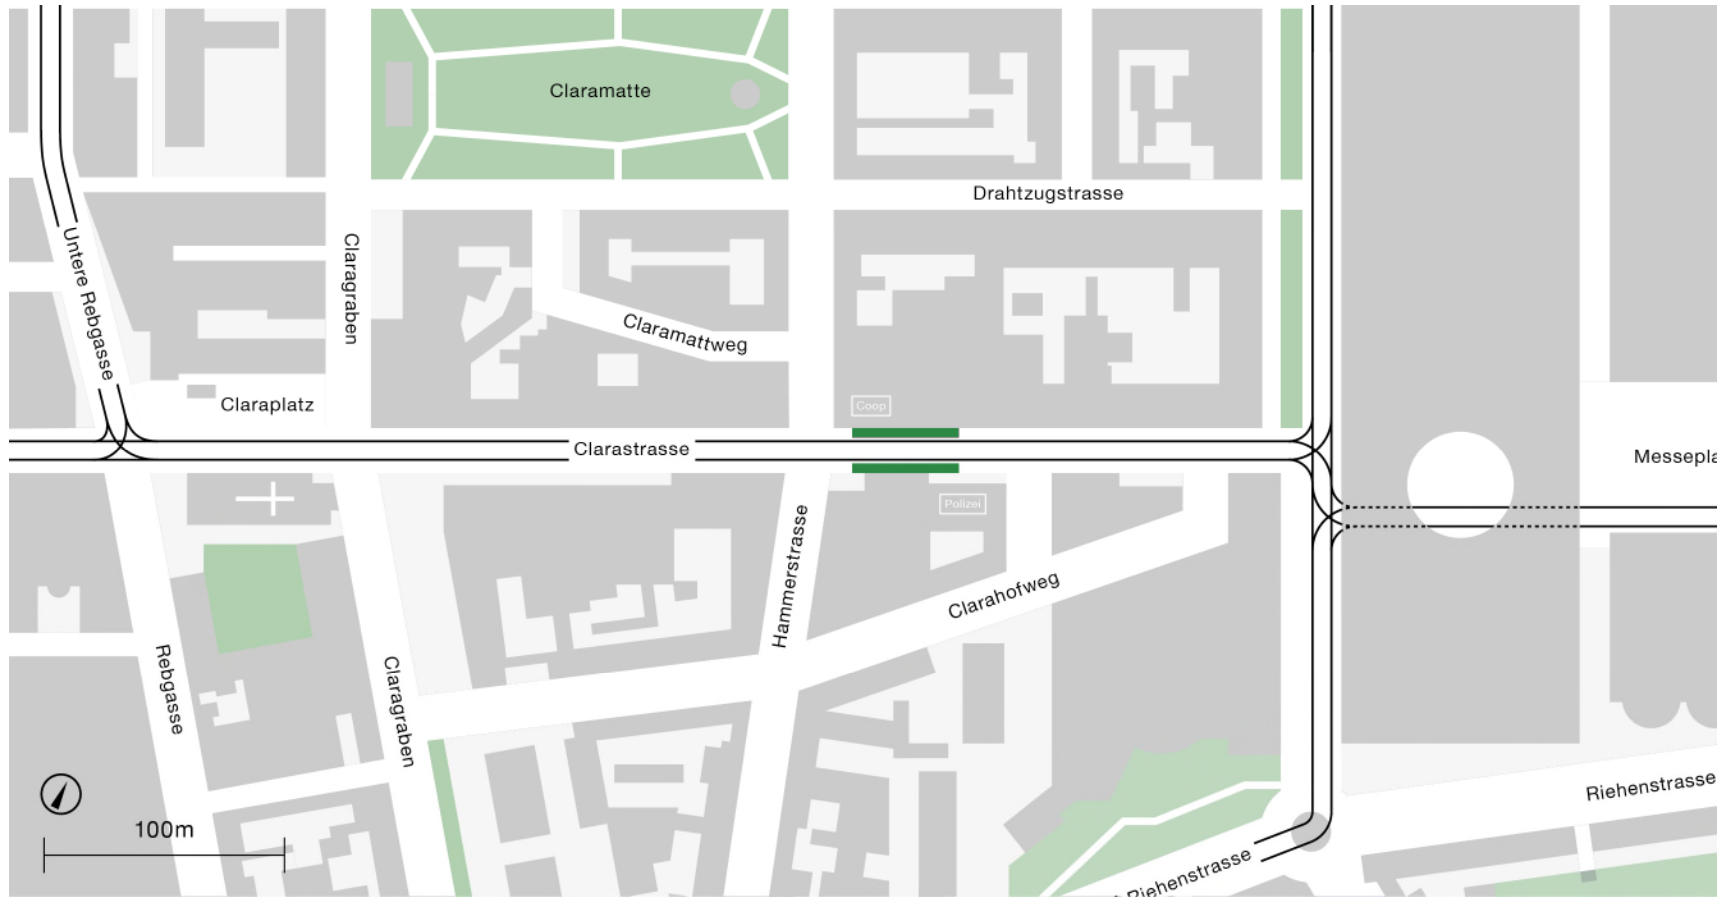

Haltestellenbau: Januar bis Februar 2025

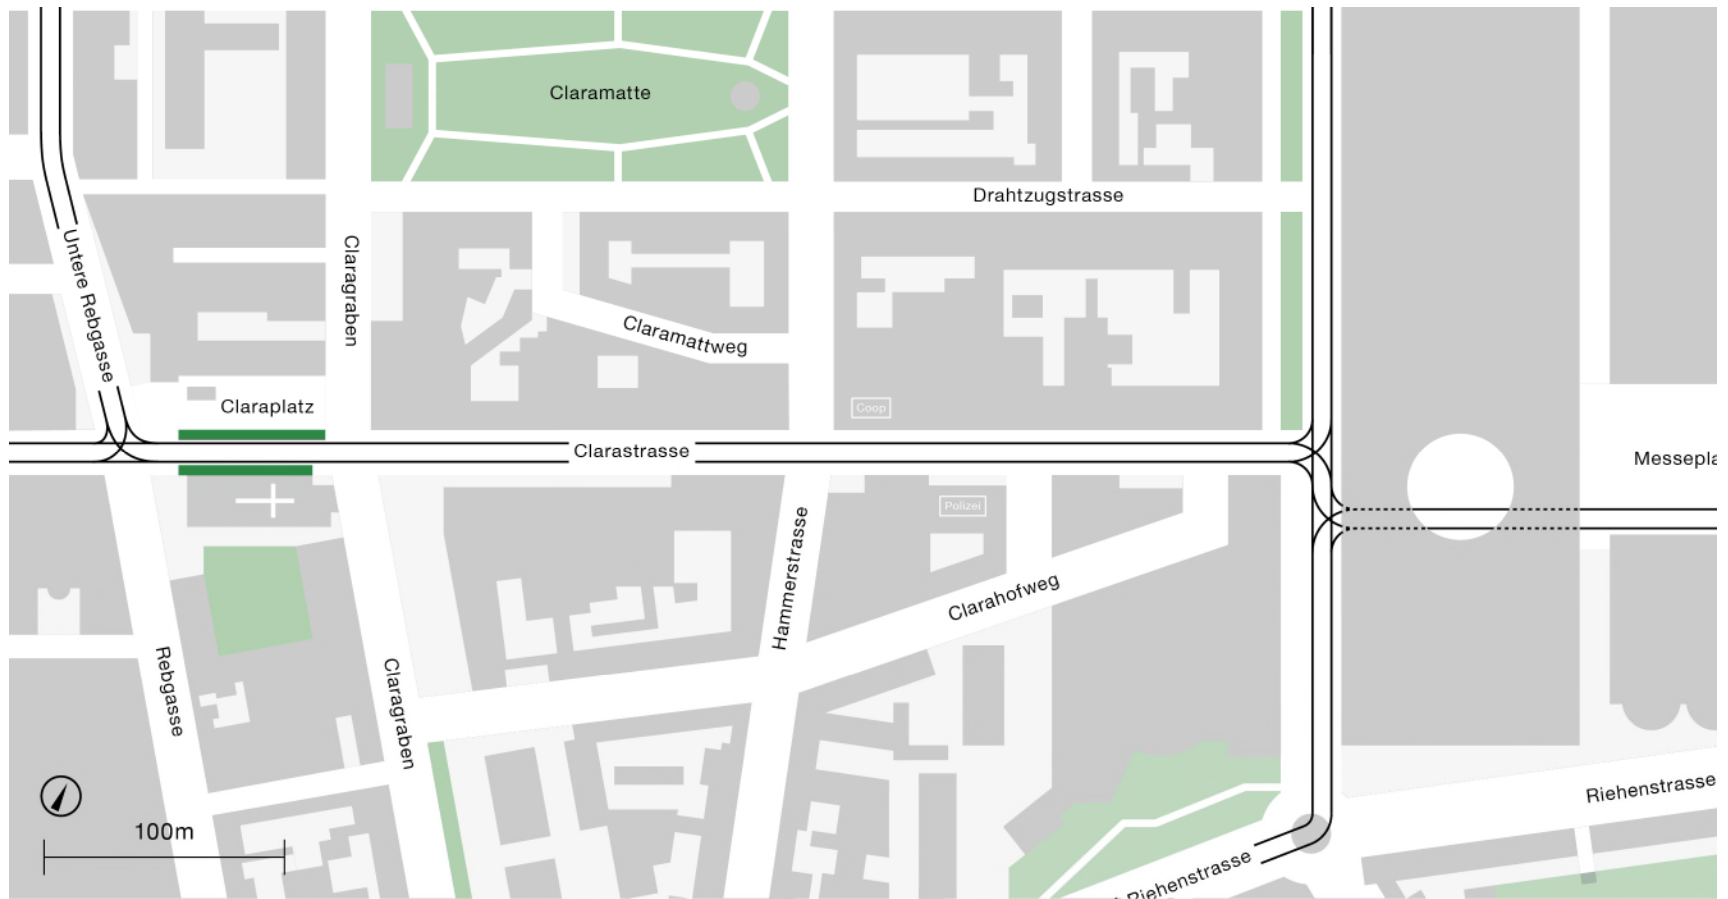


Haltestellenbau: Februar bis März 2025

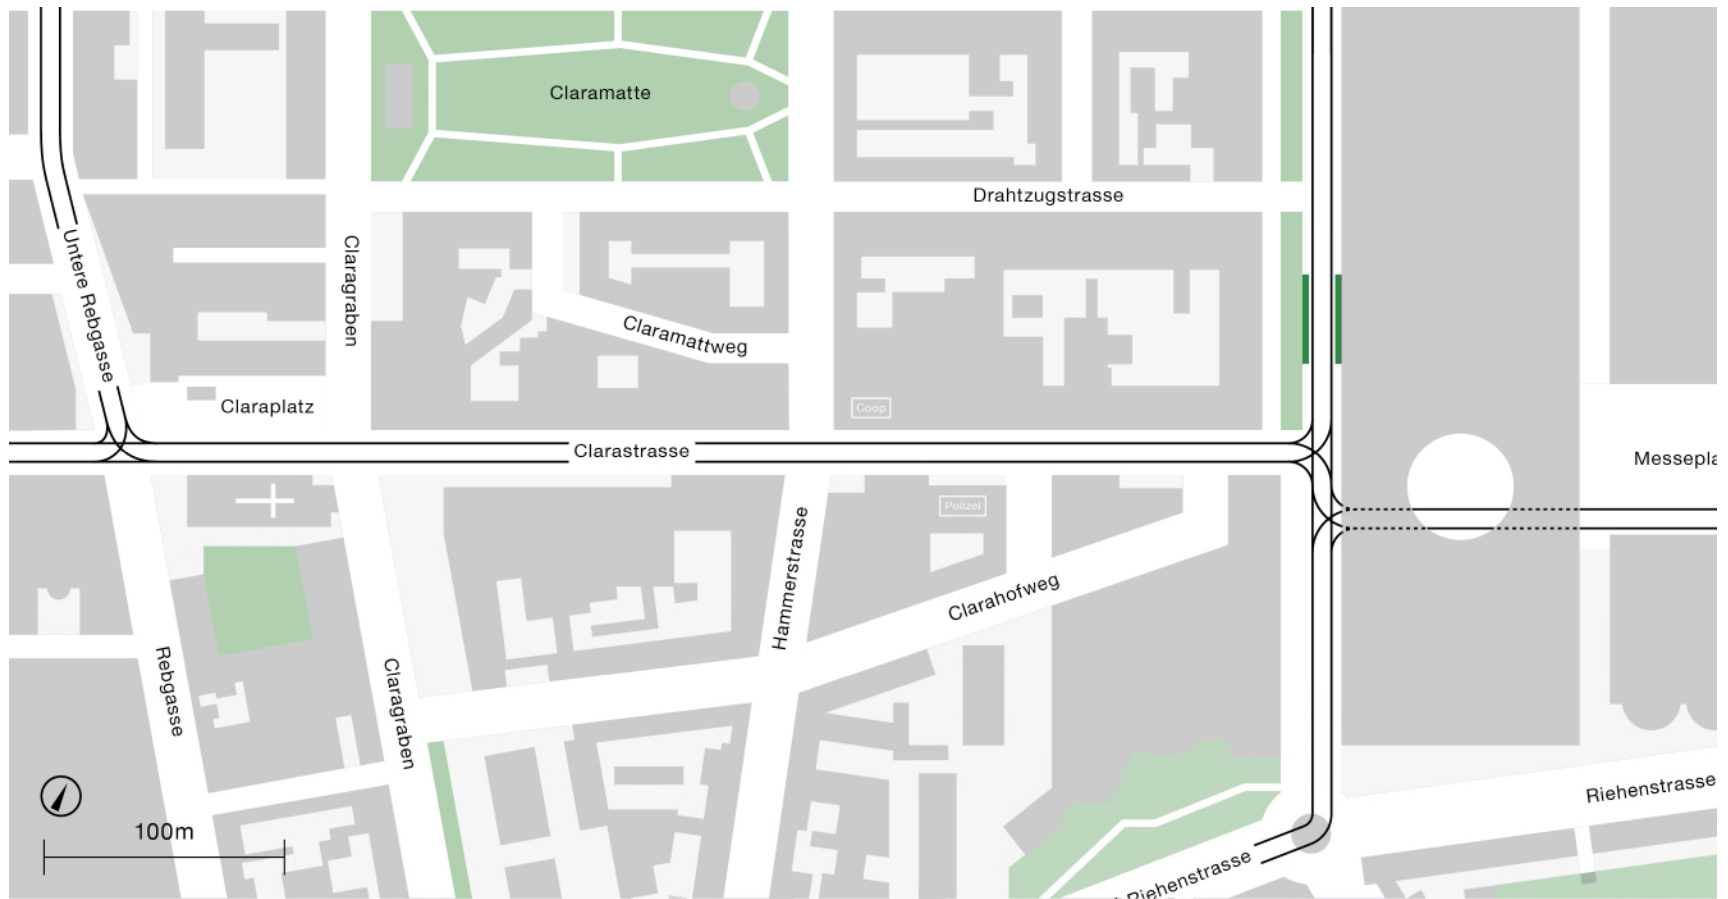

Gleisbau / Haltestellenbau: März bis Mai 2025




Pflasterungen im Trottoir: Februar bis Mai 2025

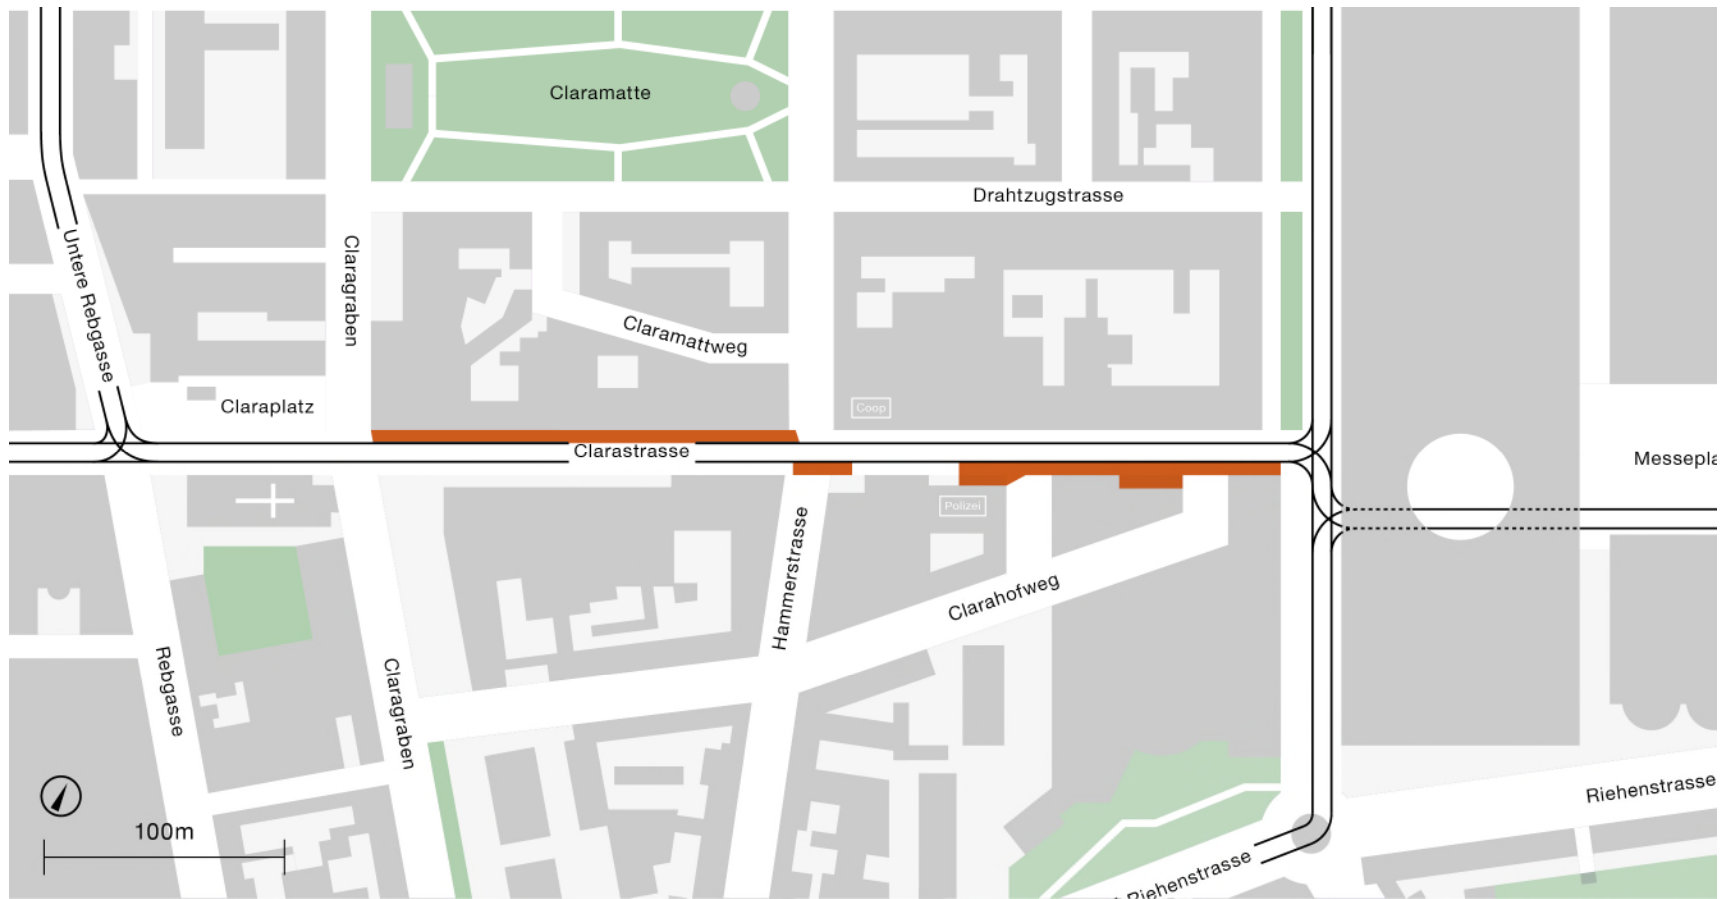


Pflasterungen im Trottoir: Mai bis Oktober 2025



Pflasterungen im Trottoir: Juni bis August 2025

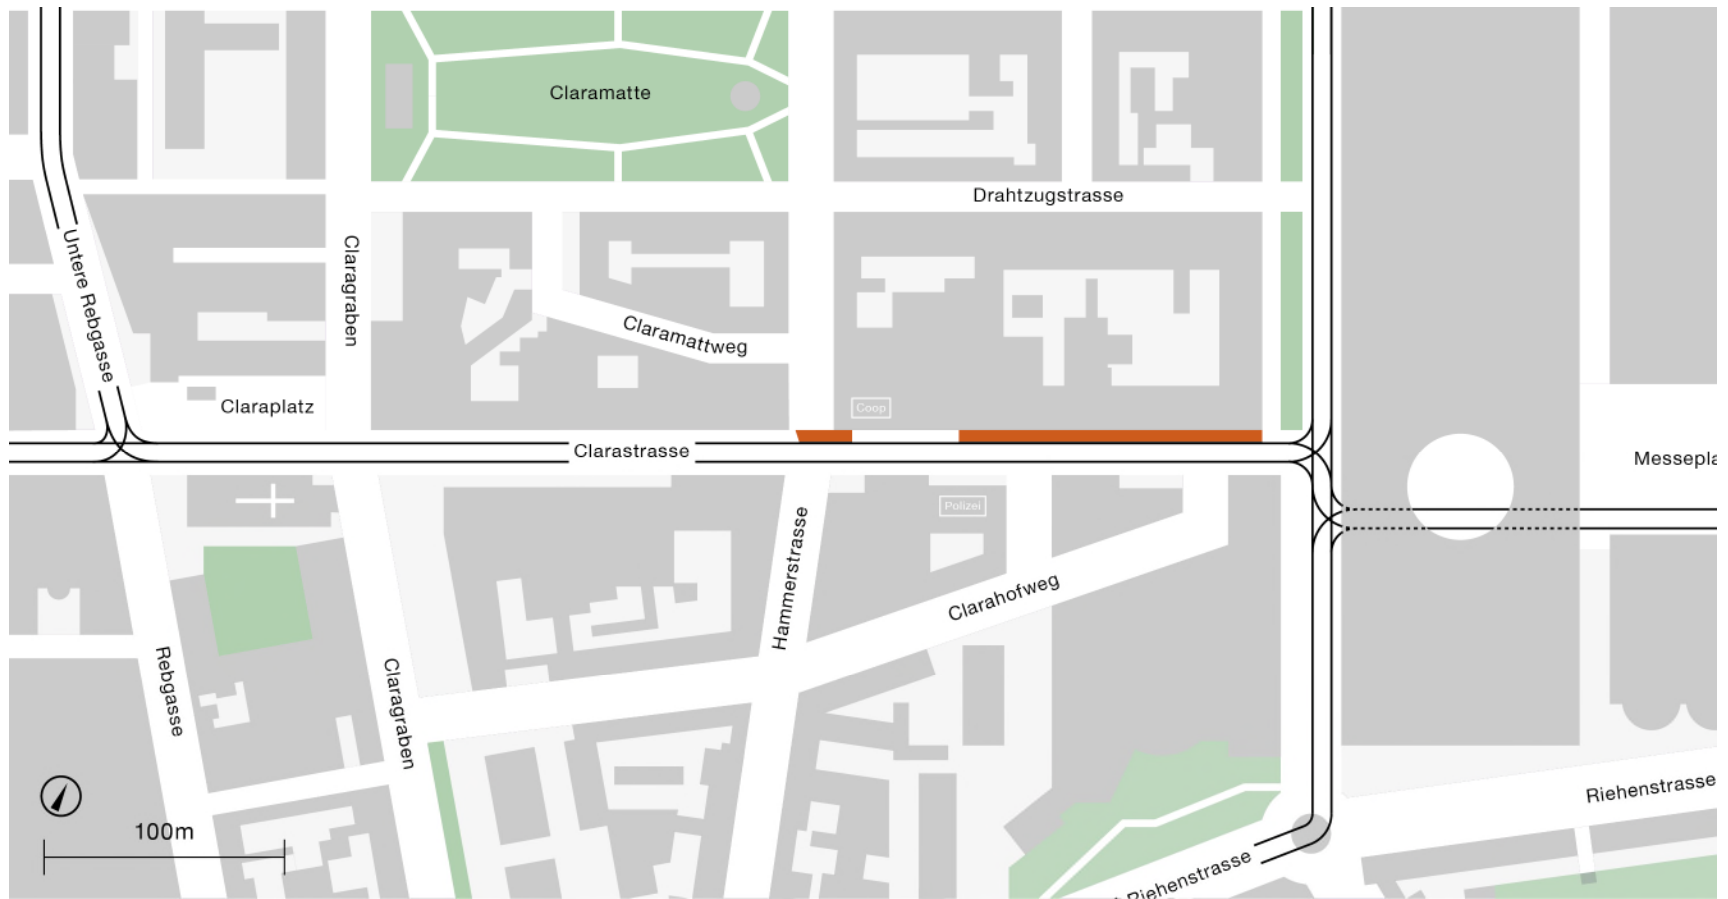

Leitungen liegen unter den Strassen verteilt

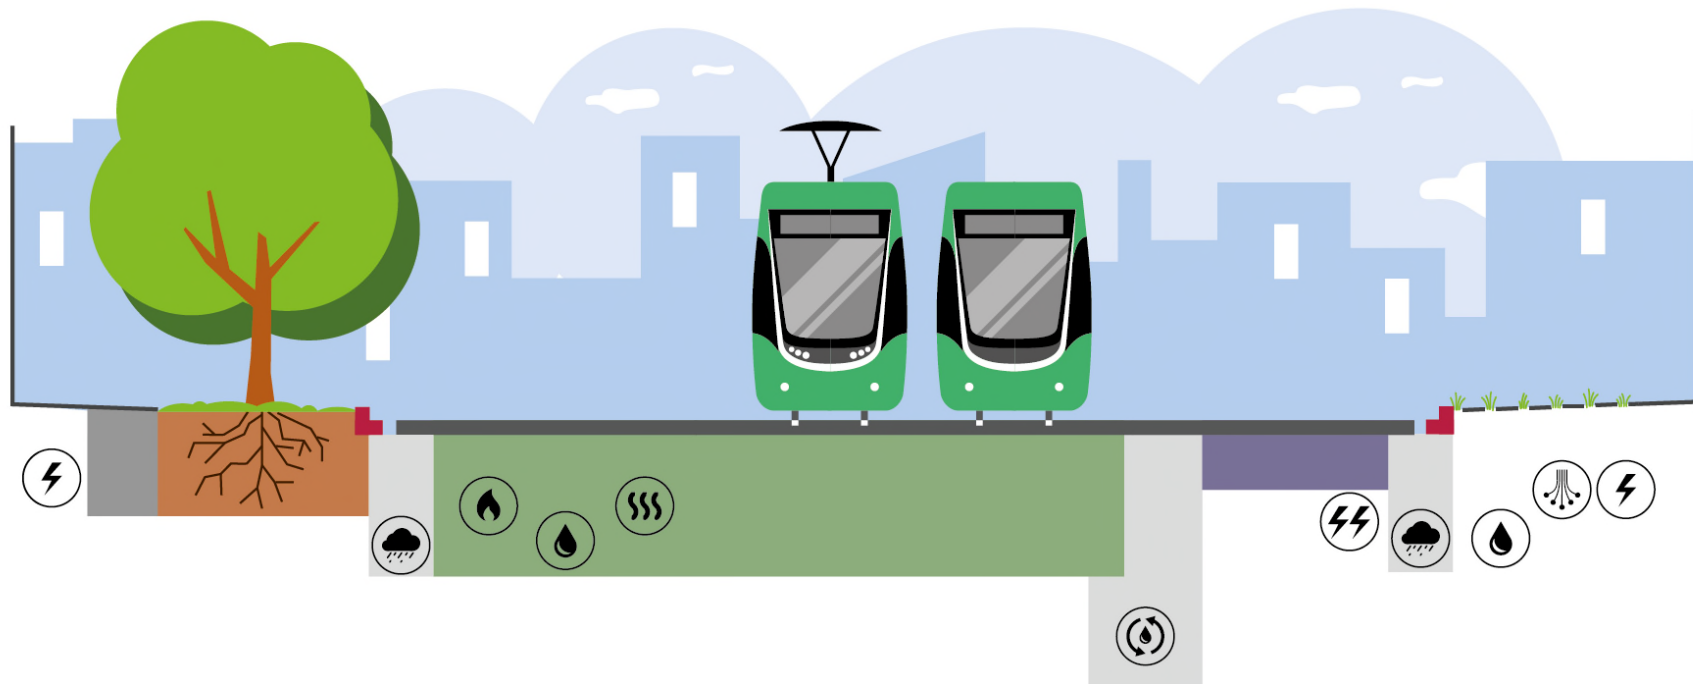

Baumwurzeln benötigen ausreichend Platz



Bei konkreten Anliegen und Fragen:

Gesamtprojektleitung

Annarita Vintan-Koger, Projektleiterin Tiefbauamt

Tel. 061 267 93 34

E-Mail: annarita.vintan@bs.ch
