



Kanton Basel-Stadt

Begleitgruppe Clarastrasse

Treffen vom 5. März 2024



Kanton Basel-Stadt

Begrüssung durch Daniel Hofer

Co-Leiter Kommunikation, Bau- und Verkehrsdepartement

Vorgesehener Ablauf:

Aktuelle Infos

Annarita Vintan-Koger, Gesamtprojektleiterin Tiefbauamt Basel-Stadt

Werkleitungsbau im 2024

Andreas Theiler, Projektleiter IWB Fernwärme

Bauprogramm und Zulieferung während des Leitungsbaus

Sabine Brugger, gsi, Bauleitungsteam

Ausblick Gleisbau 2024 - Trammersatz

Matthias Pietrass, Projektleiter BVB


Fragen und Antworten

Alle

Aktuelle Infos:

- Das Bewilligungsverfahren für den Gleisbau und Umbau der behindertengerechten Haltestellen ist nach wie vor noch nicht abgeschlossen.
- Die Bauarbeiten wurden am 22. Januar 2024 wieder aufgenommen. Der nächste Unterbruch der Bauarbeiten ist zur ART Basel vorgesehen.
- Bis Ende August 2024 werden Leitungsarbeiten hauptsächlich auf der Seite mit den geraden Hausnummern zwischen Claraplatz und Hammerstrasse sowie im Kreuzungsbereich Riehenring / Clarastrasse ausgeführt.
- Ab September bis Ende November 2024 erfolgen Gleisbauarbeiten unter Vollsperrung des Abschnitts für ÖV und MIV. BVB wird einen Trammersatz anbieten.

Werkleitungsbau im 2024

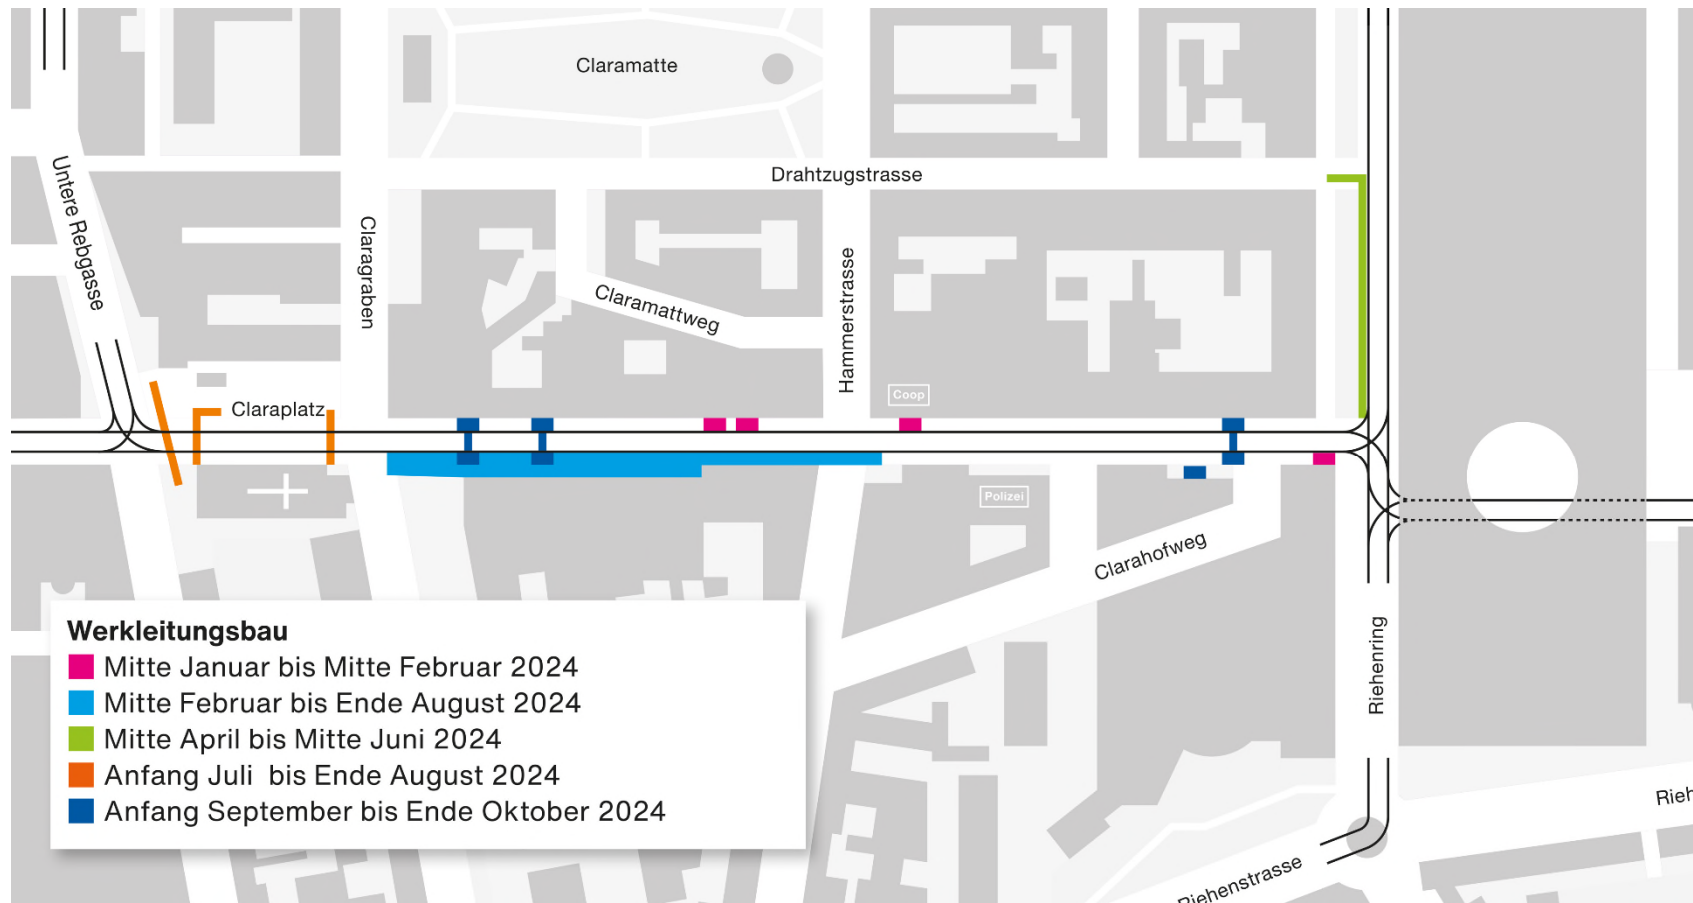

Info Leitungsbau IWB im 2024

Fernwärme 1. Etappe

Hammerstrasse – Liegenschaft Nr. 6 von 26.02. – 07.06.2024

- Grabarbeiten
- Inbetriebnahme Provisorium
- Abbruch der alten Leitung
- Rohrmontagen, inkl. 4 Hausanschlüsse
- etappenweise Auffüllung
- Provisorische Instandsetzung

Info Leitungsbau IWB im 2024

Fernwärme 2. Etappe

Liegenschaft Nr. 6 – Claragraben von 17.06. – Mitte August 2024

- Grabarbeiten
- Inbetriebnahme Provisorium
- Abbruch der alten Leitung
- Rohrmontagen, inkl. 2 Hausanschlüsse
- etappenweise Auffüllung
- Provisorische Instandsetzung

Info Leitungsbau IWB im 2024

Elektro

Liegenschaft Nr. 6 – Claragraben von 25.03. – Ende April 2024

Liegenschaft Nr. 10 – Hammerstrasse von 17.06. – Ende August 2024

Wasserleitung

Liegenschaft Nr. 2+6+38 von 12.03. – Ende April 2024

Liegenschaft Nr. 12+20+26 von 17.06. – Ende Juli 2024

Zulieferung während des Leitungsbaus

Neubau Fernwärmeleitung Clarastrasse ab 26.02.2024:

Die Zulieferung zu den Liegenschaften im Bereich des Leitungsbaues erfolgt ab Hammerstrasse oder via gegenüberliegender Strassenseite / Trottoire.

Neubau Kanalisation Riehenring ab Mitte April 2024:

Für diesen Abschnitt wurde ein detaillierter Bau- und Verkehrsphasenplan erarbeitet. Einzelheiten werden frühzeitig bekanntgegeben.


Ziel der Etappierung ist:

Trottoirs, Zugänge zu Geschäften,
Restaurants und Liegenschaften
jeweils mittels Grabenbrücke
gewährleisten. Beeinträchtigungen
werden frühzeitig angekündigt.

Infocontainer:

Aufgrund der geringen Nachfrage öffnen wir den Infocontainer vorerst nur bei Bedarf nach Absprache. Der Container steht 2024 auf dem Trottoir Ecke Claragraben / Clarastrasse.

Installationsplätze, Infocontainer und Veloumleitungsrouten (17. April bis August 2024)

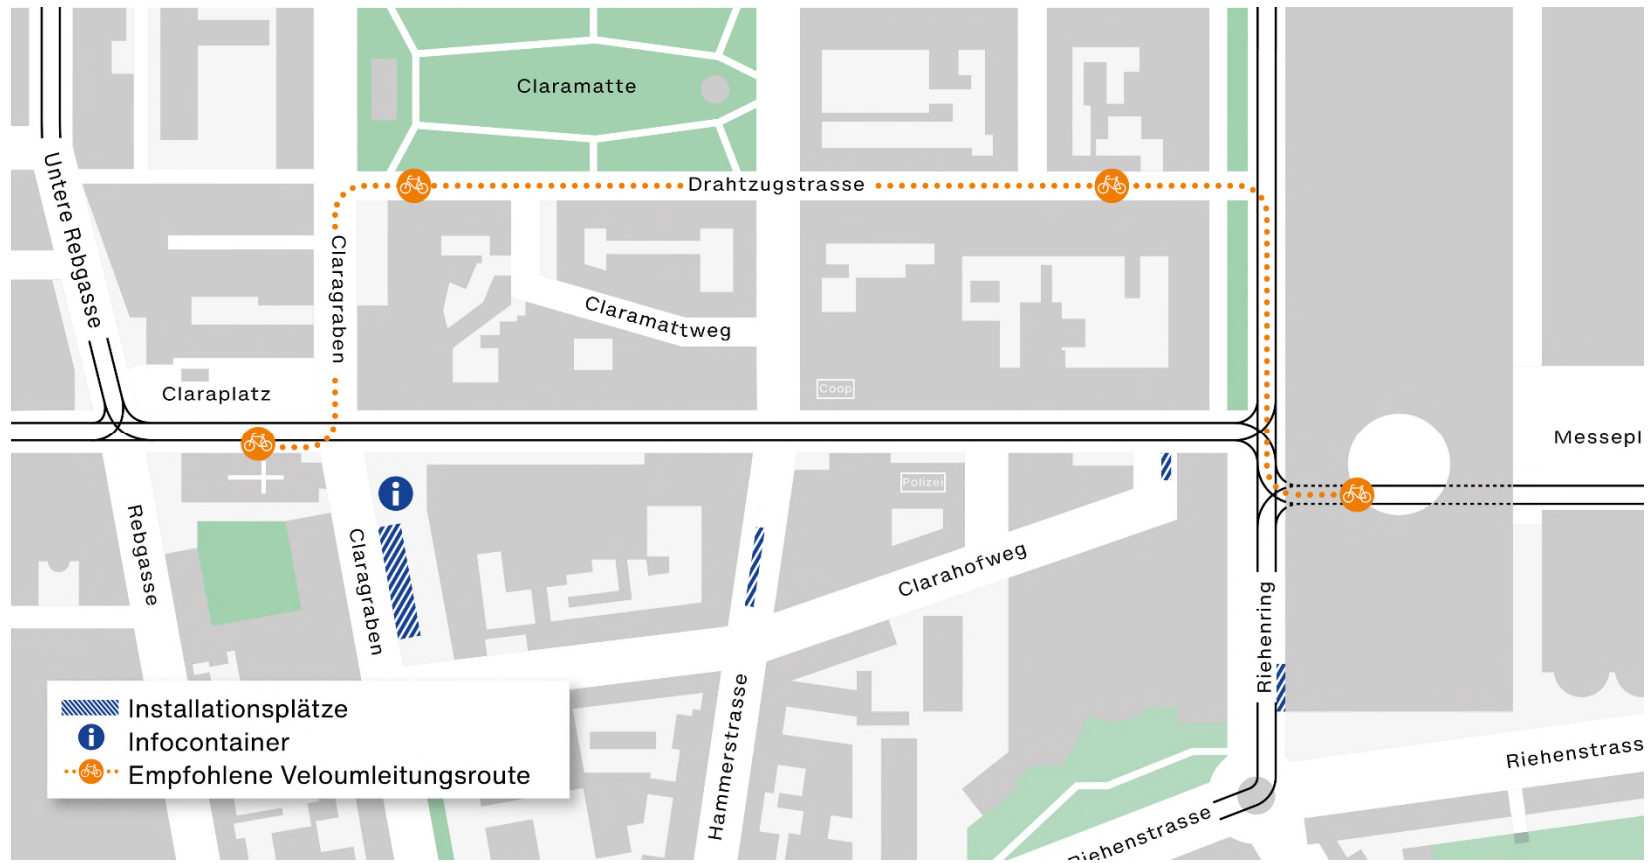

Ausblick Gleisbau 2024

Einsprache gegen Gleisbau weiter offen


→ Festlegung definitiver Gleisperimeter erst nach Verfügung vom BAV

Gleisbau wird zurzeit in Abstimmung mit Unternehmer geplant.



Folgende Nacharbeiten / Wochenendarbeiten sind vorgesehen:

- 30.08. wenn möglich ab 22.00 Uhr – Sonntag 01.09. 17.00 Uhr
(Abbruch Gleise ab 30 % Messeplatz Richtung Claraplatz)
- 17./18.09. Arbeit Lärmintensiv zwischen 07.00 – 22.00 Uhr
- Schweissen jeweils einen Tag nach dem Betonieren immer ab 20.00 Uhr

Tramersatz

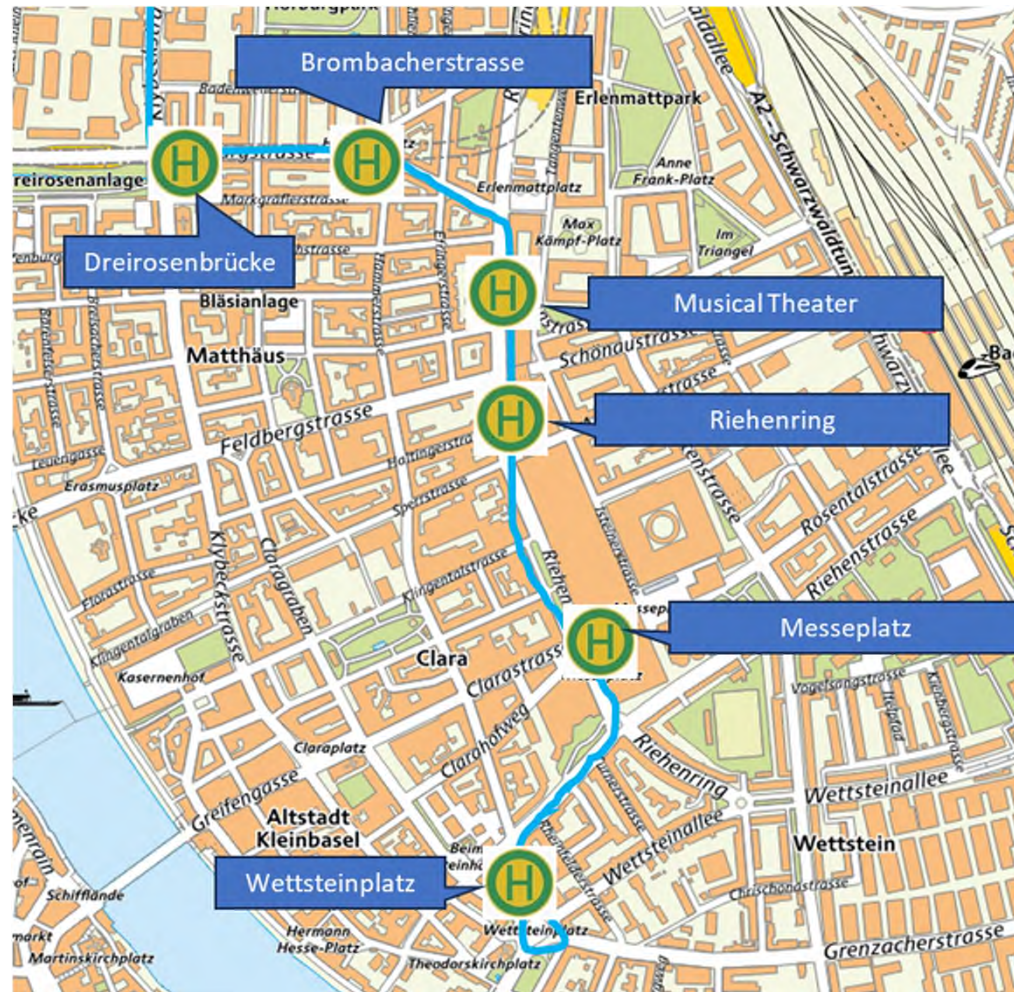

Prov. Haltestellen Messeplatz / Wettsteinplatz

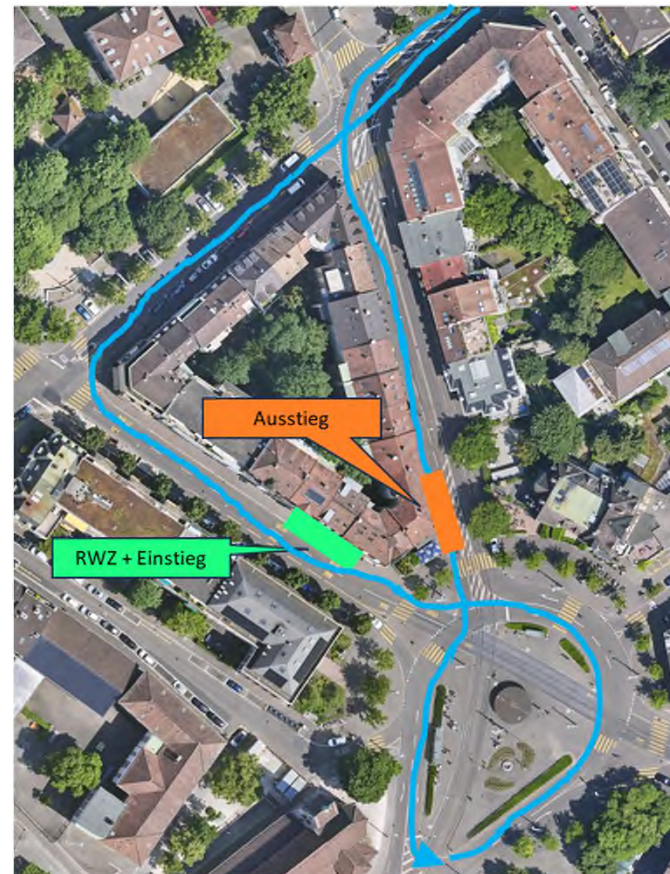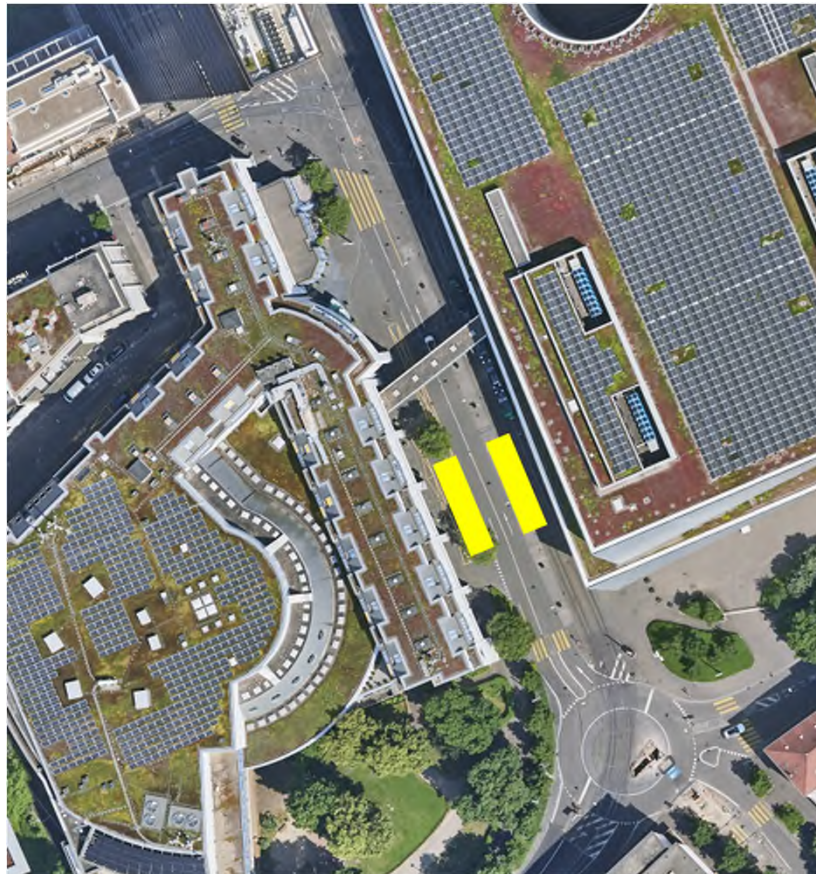

Fragen ?

Bei konkreten Anliegen und Fragen:

Gesamtprojektleitung

Annarita Vintan-Koger, Projektleiterin Tiefbauamt

Tel. 061 267 93 34

E-Mail: annarita.vintan@bs.ch
