Docusign Envelope ID: BCE08285-930C-83DC-83A1-6D9F438E879E

BLT Linie 10 / 17
Gesamterneuerung Leimental


Gemeinde	Basel, Binningen, Bottmingen	14.10.01
Los 3	Zoo - Bottmingen Schloss	
Strecke	Basel - Rodersdorf	
km	0.372 - 3.474	

AUFLAGEPROJEKT

Mastliste FL - Masten

Los 3

DER PROJEKTVERFASSER:	DIE BAUHERRSCHAFT:
projektplan.ch ag	Bahntechnik Müller GmbH / BLT Baselland Transport AG
Signiert von: 9A5FE15F5B494F6...	i.A. 396DCE0DD6674EC...
Hanspeter Stadelin	Hans-Jürgen Dippold
	DocuSigned by: i.V. 12B2990D6C90422...
	Reto Rotzler
	DocuSigned by: F992A2C7A837447...
	Fabiano Rosa

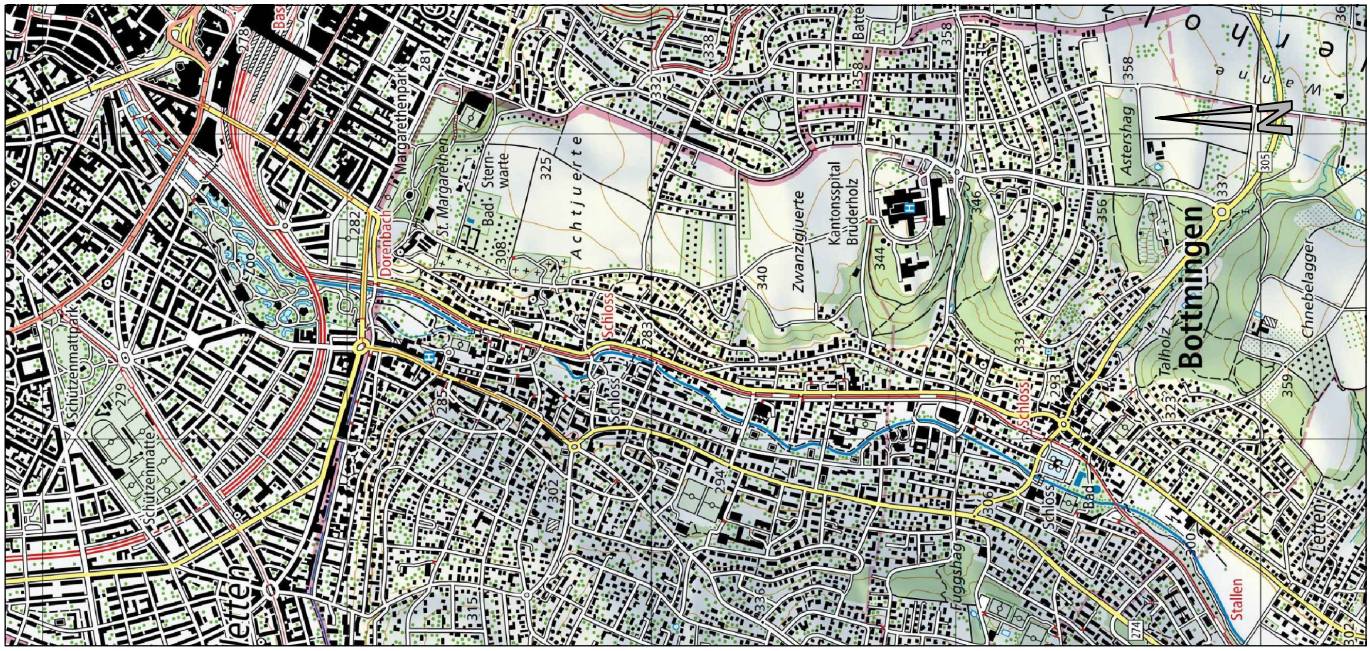

CAD-SYSTEM: AutoCAD LT 2023		BAUHERRSCHAFT:
PLANFORMAT: A4	MASSSTAB: kein	BLT Baselland Transport AG Grenzweg 1 CH-4104 Oberwil Tel. +41 61 406 11 11 Fax +41 61 406 11 22 www.blt.ch
PLANNUMMER PROJEKTVERFASSER 14.10.01		

PROJEKTVERFASSER

Bahntechnik Müller GmbH
Ingenieurdienstleistungen, Servicedienstleistungen,
Anlagen und Ausrüstungen für Bahnen und elektrotechnische Anlagen

Bahntechnik Müller GmbH
Alois-Senefelder-Straße 1-3
D-68167 Mannheim
Tel: +49 (0)621 / 83351-0

projektplan
präzis geplant

projektplan
buchgrindelstrasse 13
ch - 8620 wetzikon
tel +41 44 972 25 25
www.projektplanag.ch

INDEX	DATUM	GEZ.	KONTR.
-	12.06.2026	HS / HD	

Docusign Envelope ID: BCE08285-930C-83DC-83A1-6D9F438E879E

Bahntechnik Müller GmbH projektplan

Plangenehmigungsverfahren
Linie 10 / 17 - Gesamterneuerung Leimental

Los 3 - Mast- und Fundamenttafel 33610094

Mastnummer	Masttyp / Bemerkung	Länge	Fundamenttyp	Bahn-km	Mastvorderkante - Gleisachse [m]
17.049	Rund 324/25	11m	DPX	1.094,62	5,61
17.062	HEB220	11m	DP1	1.512,86	4,35
17.063	HEB220	11m	DP1	1.544,07	3,31
17.064	HEB 220	11m	DP1	1.574,11	2,78
17.065	HEB 240	11m	DP2	1.602,59	1,99
17.066	HEB 220	11m	DP1	1.664,37	2,00
17.067	Rund 324/16	11m	DP2	1.720,78	5,94
17.069	Rund 324/16	11m	DP2	1.791,08	6,86
17.070	Rund 324/16	11m	DP2	1.818,70	5,05
17.071	Rund 324/18	11m	HP1	1.837,40	4,95
17.072	Rund 324/18	11m	HP1	1.853,21	2,10
17.073	Rund 324/18	11m	HP1	1.868,23	2,30
17.074	HEB 240	11m	DP2	1.883,33	komb.mit Perrondach
17.075	HEB 260	11m	DP2	1.901,91	komb.mit Perrondach
17.076	HEB 260	11m	DP2	1.915,02	komb.mit Perrondach
17.077	HEM 240	11m	HP1	1.925,45	3,42
17.089	HEB 260	11m	DP2	2.428,59	4,36
17.090	HEB 260	11m	DP2	2.452,91	5,41
17.091	HEM 280	11m	DPX	2.463,22	1,78
17.092	HEM 300	11m	DPX spez.	2.496,05	1,76
17.093	HEB 260	11m	DP2	2.537,61	3,57
17.094	HEB 260	11m	DP2	2.592,47	2,47
17.095	HEM 300	11m	DPX spez.	2.616,15	1,72
17.096	HEM 280	11m	DPX	2.656,66	1,72
17.097	HEB 240	11m	DP2	2.713,59	1,87
17.098	HEB 220	11m	DP1	2.767,56	1,78
17.099	HEM 280	11m	DPX	2.822,35	1,70
17.100	HEB 260	11m	DP2	2.877,15	1,76
17.101	HEM 280	11m	DPX	2.936,66	1,68
17.102	HEB 220	11m	DP1	2.996,16	1,69
17.103	HEB 240	11m	DP2	3.040,50	5,00
17.104	HEB 220	11m	DP1	3.074,76	1,94
17.105	HEB 240	11m	DP2	3.108,20	1,98
17.106	HEB 220	11m	DP1	3.145,01	1,88
17.107	HEM 280	11m	DPX	3.179,89	1,97
17.108	HEM 300	11m	DPX spez.	3.210,21	1,72
17.109	HEM 240	11m	HP1	3.240,71	2,19
17.110	HEB 260	11m	DP2	3.268,59	2,19
17.111	HEM 300	11m	DPX spez.	3.293,46	2,32
17.112	HEM 300	11m	DPX spez.	3.313,47	2,32
17.113	Rund 324/25	11m	DPX	3.334,09	3,26
17.114	HEM 240	11m	HP1	3.362,77	4,00
17.115	Rund 324/25	11 m	DPX	3.394,20	1,84
17.116	Rund 324/18	11 m	HP1	3.408,89	1,78
17.117	Rund 324/18	11 m	HP1	3.421,12	1,81
17.118	Rund 324/16	11 m	DP2	3.434,06	2,12
17.118S	Rund 273/13	8 m	DP1	WS Bottmingen	2,77
17.119S	Rund 273/13	8 m	DP1	WS Bottmingen	2,74
17.120S	Rund 273/13	8 m	DP1	WS Bottmingen	2,79
17.121S	Rund 273/13	8 m	DP1	WS Bottmingen	2,77
17.122S	Rund 273/13	8 m	DP1	WS Bottmingen	2,78
17.123S	Rund 273/13	8 m	DP1	WS Bottmingen	2,77
17.124S	Rund 273/13	8 m	DP1	WS Bottmingen	2,78
17.125S	Rund 273/13	8 m	DP1	WS Bottmingen	2,77
17.126S	Rund 273/13	8 m	DP1	WS Bottmingen	2,78
17.127S	Rund 273/13	8 m	DP1	WS Bottmingen	2,76
17.128S	Rund 273/13	8 m	DP1	WS Bottmingen	2,83
17.119	HEM 280	11 m	DPX	3.460,13	1,72
